



2020年8月26日  
JR東日本 仙台支社

## 只見線（会津川口～只見間） 復旧工事の完了時期について

JR東日本では、2017年6月に福島県と締結した「只見線（会津川口～只見間）の鉄道復旧に関する基本合意書及び覚書」に基づき、2018年6月に起工式を実施して以降、復旧工事を進めてまいりました。

その後の工事進捗に伴い、第6只見川橋りょうにおいて地質条件が想定よりも悪いことが判明したため、橋りょうの桁架設のための工法を再検討し、全体工程への影響を精査しております。

その結果、復旧工事完了時期として2021年度中を目途に完了する予定でしたが、以下の通り変更となりましたのでお知らせいたします。


引き続き、関係の皆さまとも協力しながら、安全かつ着実な復旧工事の推進に努めてまいります。

### 【復旧工事完了見込み】


- ・ 2022年度（令和4年度）上半期を見込んでおります。
- ・ 復旧工事完了後は、訓練運転等を行い、2022年（令和4年）中の運転再開を目指してまいります。

※今後の気象条件などにより、上記見込み時期については変更になる場合があります。  
その場合は改めてお知らせいたします。

## ■ 只見線復旧工事区間

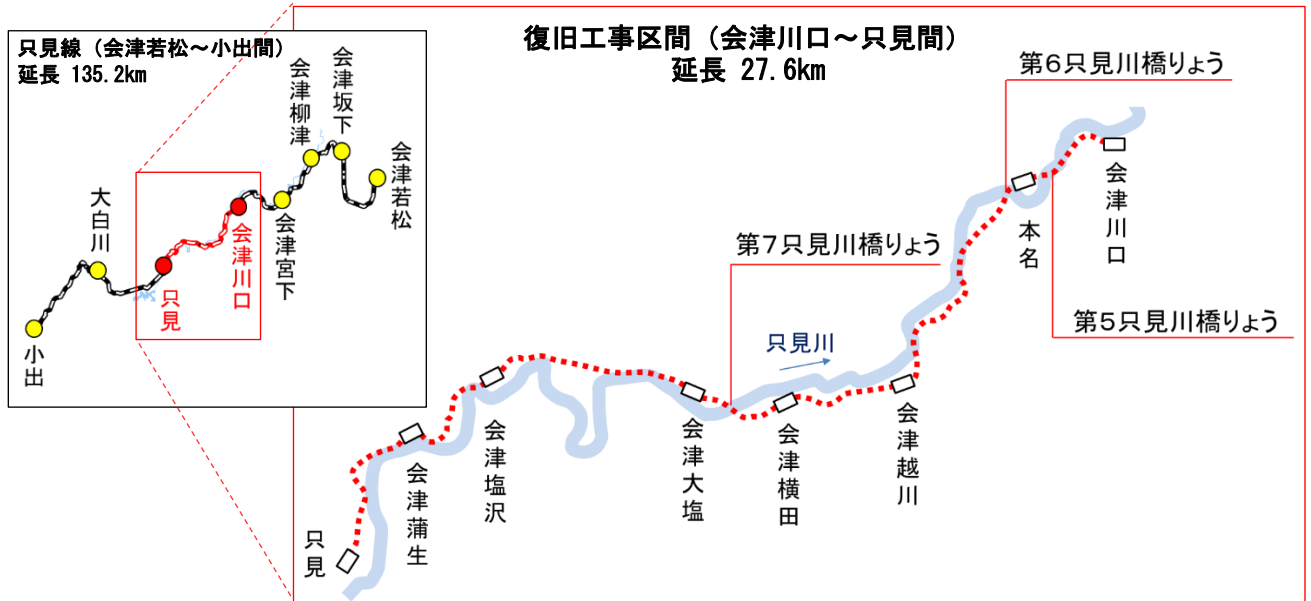

## ■ 第6只見川橋りょう桁架設の工法変更

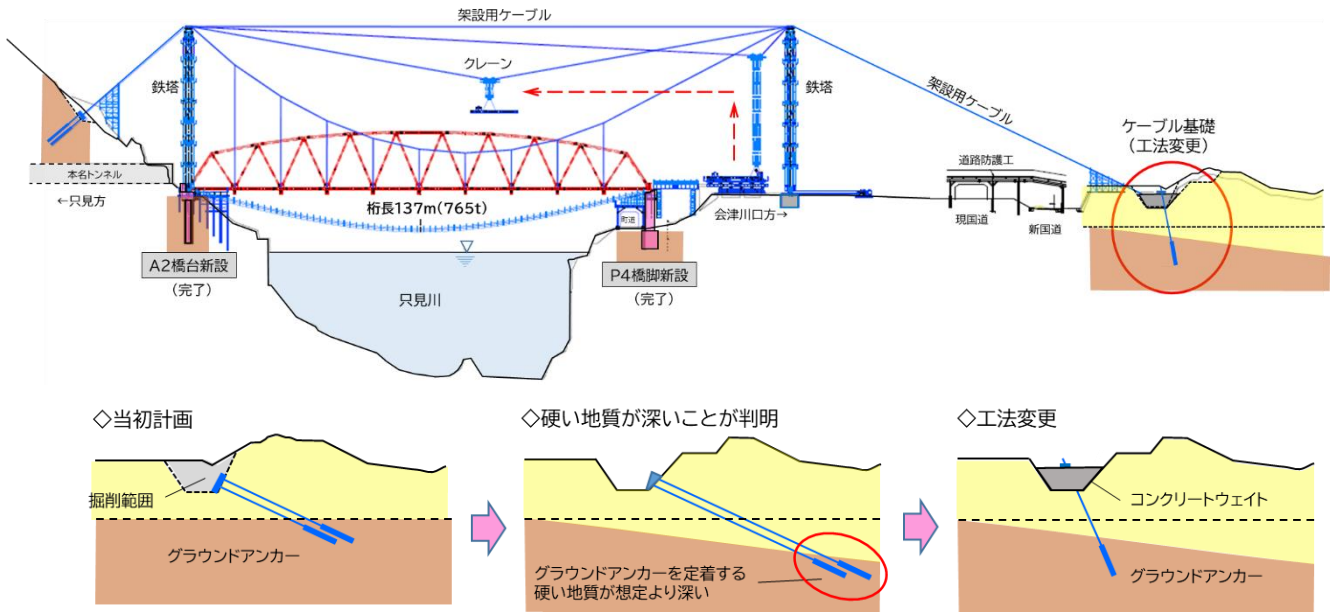

## ■ 只見線 復旧工事の進捗状況

- ・ 鉄道復旧工事（2018年6月15日起正式開催）は、現在各種工事を実施
- ・ 第5只見川橋りょう（流失）は、橋脚・桁架設が施工完了、軌道工事を施工中
- ・ 第6只見川橋りょう（流失）は、橋脚の施工完了、桁架設の準備工を施工中
- ・ 第7只見川橋りょう（流失）は、橋脚の施工完了、桁架設を施工中
- ・ その他、斜面や盛土の復旧工事、マクラギ交換などの軌道工事を実施中



● 第5只見川橋りょう



被災状況



桁架設完了

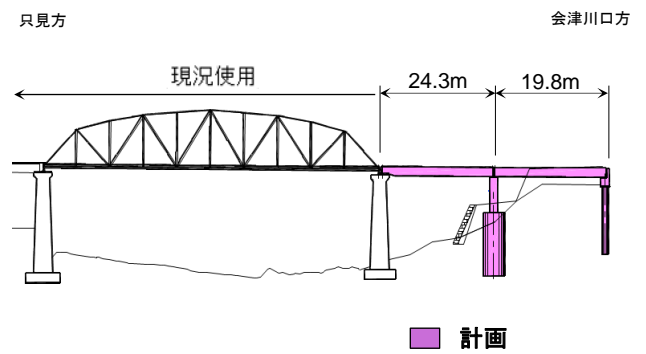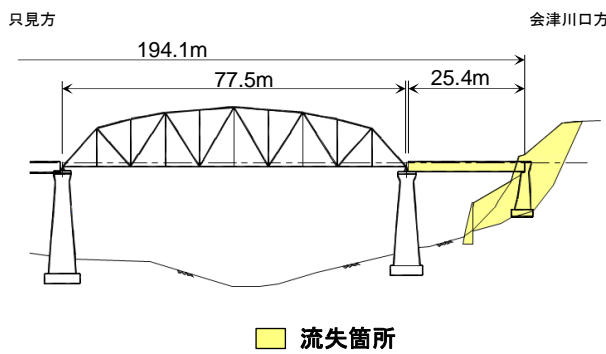



● 第6只見川橋りょう



被災状況



桁架設準備工施工中

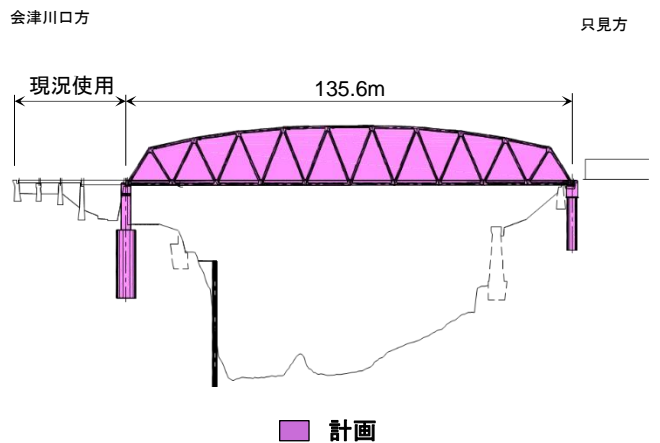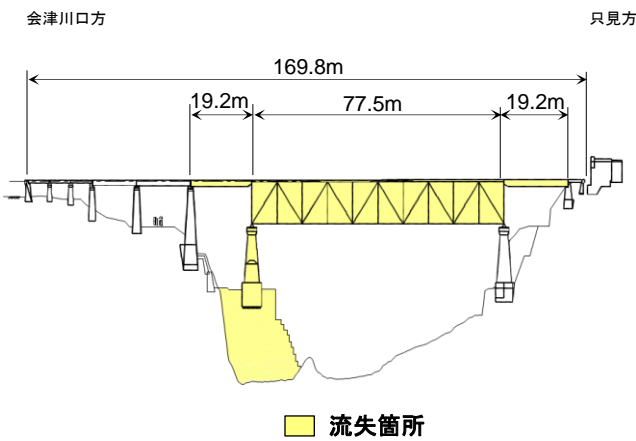


● 第7只見川橋りょう




被災状況



桁架設施工中

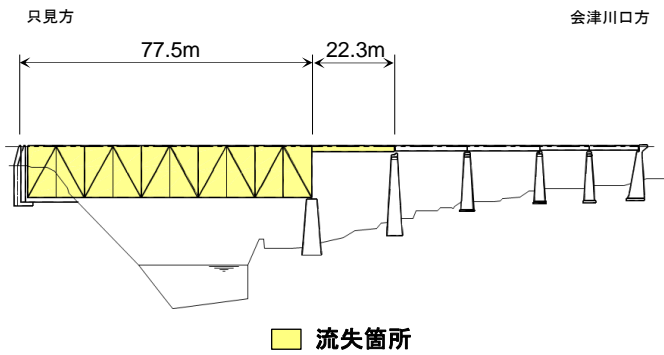

流失箇所

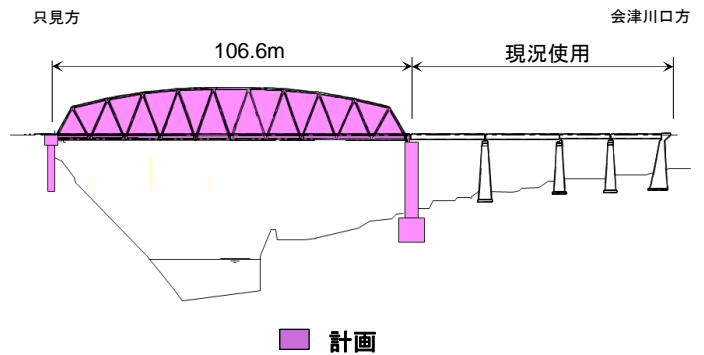

計画

● その他、主な復旧工事箇所

斜面崩壊にともない、のり面補修や軌道復旧工事を実施



被災状況



復旧状況
